



サツコイ！（仮） 制作工程表（詳細版）

本番リリース（v1.0）までの開発スケジュール
納品目安：着手から1.5～2ヶ月


2026年9月（改訂）発行：ViFight

1. 本工程表について

本書は、すでに完成・公開しているプロトタイプ（Phase 1）をもとに、外部連携やお金が絡む処理を実運用化し「本番リリース（v1.0）」として納品するまでの制作スケジュールです。全体を8週間（約2ヶ月）で構成し、1.5ヶ月時点で限定公開のβ、2ヶ月時点で一般公開・正式納品とします。

- ・ プロトタイプの位置づけ：現在のデモは画面と業務ロジックを実装済みですが、LINE連携・Stripe決済・メール配信・書類保存・自動処理（定期実行）は「デモ用の仮実装（スタブ）」です。本工程では、これらを本番へ実接続する新規開発を行います。
- ・ 工数（人日）について：各工程の人日はViFightの概算見積りです。実際の数値・体制人数は契約時に精査・確定します。
- ・ 体制：役割別（PM／バックエンド／フロントエンド／インフラ／デザイン／QA）で記載します。各役割の人数（兼任含む）は体制確定時に決定します（要確定）。
- ・ 法務：規約・特商法・異性紹介事業の該当判断等は、ViFightが外部専門家を紹介・調整のうえ、アプリへ実装反映します。
- ・ 着手日：本書は着手（契約締結）を第1週の開始とした相対週（W1～W8）で記載しています。実日付は要確定です。
- ・ β（限定公開）と一般公開：βは招待・少人数向けの限定公開です。本番の実決済・LINE本番配信は各社の審査承認が前提です。

2. 全体スケジュール

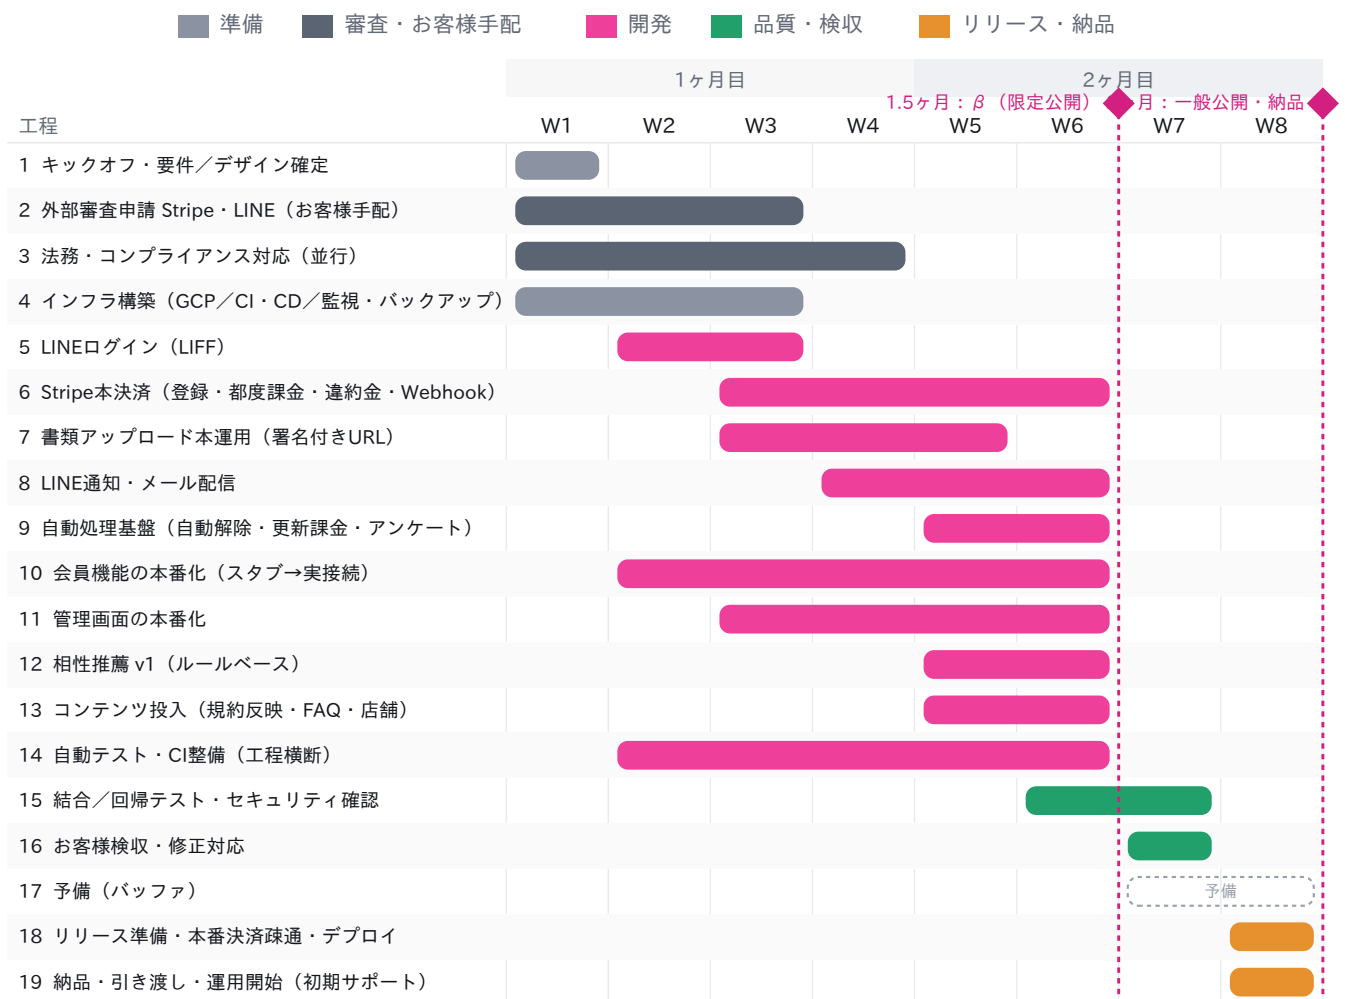

W=着手からの週数。破線は主要マイルストーン（1.5ヶ月=限定公開β／2ヶ月=一般公開・納品）。工程17「予備」は遅延・手戻りを吸収するバッファです。工程2・3はお客様手配を含む外部依存で、ViFightが支援・実装反映します。

3. 開発体制（役割）

本件は以下の役割で進行します。各役割の人数（兼任を含む）は体制確定時に決定します（要確定）。

役割	主な担当範囲
PM（進行管理）	スコープ・進行管理、外部審査/法務の調整、検収窓口、定例運営。
バックエンド	API、Stripe決済、LINE/メール通知、書類保存、自動処理（cron）。
フロントエンド	会員向け画面・管理画面の本番化。
インフラ	GCP構築、CI・CD、監視・バックアップ、リリース。
デザイン	UIの最終調整（デザインシステムは実装済み）。
QA（品質）	自動テスト整備、結合/回帰テスト、セキュリティ確認。
外部専門家（法務）	規約・特商法・異性紹介事業の該当判断等（ViFightが紹介・調整）。

4. 工程の詳細（サブタスク・担当・工数・完了条件）

各工程を作業レベルまで分解しています。「完了条件」は、その工程が完了したと判断する基準（Definition of Done）です。

1. キックオフ・要件／デザイン確定

担当：PM・デザイン／目安3人日／W1

- ・ スコープ・優先順位の合意（プロトタイプをベースに差分を確定）
- ・ 画面・仕様の最終確認、デザイン（トークン・部品は実装済み）の確定
- ・ 品質基準・完了条件（DoD）の合意
- ・ 開発計画・環境・ブランチ運用・定例の設定

完了条件：スコープ・仕様・DoDが文書化され、双方で合意している

2. 外部審査申請（Stripe・LINE）

担当：PM（お客様手配を支援）／目安2人日／W1-W3

- ・ Stripe本番審査の申請支援（事業内容・本人確認書類の準備）
- ・ LINE公式アカウント開設・認証申請の支援
- ・ LINE Login／Messaging API チャンネルの作成、必要スコープ（メール取得等）の申請
- ・ 各審査の状況追跡

完了条件：各申請が受理され、承認待ち／承認の状態が明確になっている

3. 法務・コンプライアンス対応

担当：PM+外部専門家（ViFightが紹介・調整）／目安4人日／W1-W4

- ・ インターネット異性紹介事業の該当判断（「チャットなし」設計での回避可否）と必要時の届出
- ・ 利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法表記の整備（専門家）
- ・ 年齢確認方針の確定、決済・違約金・自動課金の規約反映
- ・ 機微な個人情報（身分証・独身証明・源泉徴収票）の取扱い方針

完了条件：公開に必要な法的要件がクリア（または段取り確定）し、規約類が確定している

4. インフラ構築

担当：インフラ／目安8人日／W1-W3

- ・ GCPプロジェクト・IAM・Secret Manager
- ・ Cloud Run（本番／ステージング）、Cloud SQL（Private IP・接続プール・自動バックアップ）
- ・ Cloud Storage（証明書類用プライベートバケット）
- ・ CI・CD（型検査／Lint／テスト／ビルド／デプロイ／マイグレーション自動化）
- ・ 独自ドメイン・SSL、監視・エラー通知・アップタイム監視

完了条件：ステージングが本番同等構成で稼働し、CIでデプロイ可能、監視・バックアップが有効

5. LINEログイン (LIFF)

担当：バックエンド・フロントエンド / 目安 5人日 / W2-W3

- ・ LIFFアプリの本番設定 (LIFF ID・エンドポイントURL・スコープ) と本番環境での動作確認
- ・ LINE userId と会員の連携・新規登録導線 (プロトタイプで土台を実装済み)
- ・ 既存メール認証との統合・アカウント紐付け、セッション発行・保護 (同上)

完了条件：LINEでログイン→会員として利用開始まで一気通貫、既存メール会員の連携も動作

6. Stripe本決済

担当：バックエンド / 目安 14人日 / W3-W6

- ・ 登録時のカード登録 (SetupIntent・有効性確認) + 不正／重複対策
- ・ 日程確定時の都度課金 (PaymentIntent 5,500円)
- ・ 違約金のオフセッション請求・返金 (キャンセル区分に連動)、更新料の自動課金
- ・ Webhook受信 (確定・失敗・返金・dispute)、幂等キーによる二重課金防止
- ・ 3DS (本人認証)・決済失敗時のリトライ処理

完了条件：テストモードで全課金／返金／違約金／更新が正しく動作し整合、本番接続は審査承認後に切替可能

7. 書類アップロード本運用

担当：バックエンド・インフラ / 目安 7人日 / W3-W5

- ・ プライベートバケットへの直アップロード (署名付きURL・V4)
- ・ ファイル種別・サイズ・内容の検証
- ・ 提出→運営確認→承認→公開項目の解放フロー、男性の源泉徴収票必須の審査ルール
- ・ 保管・削除ポリシー (保持期間・アクセスログ)

完了条件：会員が書類提出→運営が確認／承認→年収等が公開、書類は非公開で安全に保管される

8. 通知配信 (LINE・メール)

担当：バックエンド / 目安 7人日 / W4-W6

- ・ LINE Messaging API のpush配信 (申込／マッチ／確定／リマインド)
- ・ メール配信基盤 + ドメイン認証 (SPF／DKIM／DMARC)
- ・ 通知テンプレート・文面、通知設定 (LINE／メール／アプリ内の項目別) との連動
- ・ 配信失敗時のフォールバック

完了条件：主要イベントで LINE／メール／アプリ内通知が設定どおり届く

9. 自動処理基盤 (定期実行)

担当：バックエンド・インフラ / 目安 5人日 / W5-W6

- ・ 定期実行基盤 (Cloud Scheduler等) の構築
- ・ マッチ自動解除 (7日／48時間ルール)、更新料の自動課金バッチ
- ・ デート後アンケートの自動送信 (2時間後)、各種リマインド
- ・ 失敗時の再試行・検知

完了条件：各定期処理が指定タイミングで自動実行され、失敗が検知される

10. 会員機能の本番化

担当：フロントエンド・バックエンド / 目安 12人日 / W2-W6

- ・ 全画面のスタブを実データ／実APIに置換
- ・ 入力バリデーション・エラーハンドリング、異常系・境界値 (期限切れ・ブロック・権限)
- ・ 申込～マッチ～日程調整～デート～アンケートの通し動作
- ・ パフォーマンス・アクセシビリティの確認

完了条件：主要フローが本番データで破綻なく通る

11. 管理画面の本番化

担当：フロントエンド・バックエンド / 目安 10人日 / W3-W6

- ・ 会員・書類の確認／承認／停止／退会の実運用機能
- ・ マッチ・デート・店舗割当の管理、キャンセル・違約金・警告の管理
- ・ 通報・お問い合わせ対応、ギフト券発行・使用済み処理
- ・ 権限管理・操作の監査ログ

完了条件：運営が日常業務を管理画面だけで回せる

12. 相性推薦 v1

担当：バックエンド / 目安 4人日 / W5-W6

- ・ プロフィール項目に基づく相性表示（機械学習は行わない）
- ・ 文面のお客様確認の反映、「AI」表記の適正化（優良誤認の回避）
- ・ ※ AIアドバイザーの削除（2026年9月決定）に伴い、本工程の工数（4人日）は見直し予定（要確定）

完了条件：相性表示が実用レベルで動作し、表記が適正

13. コンテンツ投入

担当：フロントエンド（お客様提供物を反映） / 目安 2人日 / W5-W6

- ・ 確定した規約・プライバシー・特商法・FAQの反映
- ・ 提携店データの登録、お知らせ・掲載文言の投入

完了条件：公開に必要なコンテンツが揃い、正しく表示される

14. 自動テスト・CI整備

担当：バックエンド・QA / 目安 10人日 / W2-W6

- ・ 日程調整・キャンセル・決済判定など純粋ロジックの単体テスト
- ・ 主要フローのE2E（自動ブラウザテスト）
- ・ CIでのテスト自動実行、カバレッジ基準の設定

完了条件：主要ロジック・フローがテストで守られ、CIで自動検証される

15. 結合／回帰テスト・セキュリティ確認

担当：QA・バックエンド / 目安 8人日 / W6-W7

- ・ 決済＋通知＋書類の結合テスト、回帰テスト
- ・ 権限・認可・レート制限・入力の安全性確認、個人情報の取扱い確認
- ・ 主要デバイス・ブラウザの表示確認

完了条件：重大不具合ゼロ、セキュリティの基本確認をクリア

16. 検収・修正対応

担当：PM・開発全員 / 目安 5人日 / W7

- ・ 検収用チェックリストの提示、お客様検収
- ・ 指摘の分類（本フェーズ／次フェーズ）、修正・再確認

完了条件：検収項目に合格し、指摘が反映されている

17. 予備（バッファ）

担当：－ / 目安 5人日 / W7-W8

- ・ 審査遅延・検収手戻り・想定外事象の吸収

18. リリース準備・本番デプロイ

担当：インフラ・バックエンド / 目安 3人日 / W8

- ・ 本番環境への切替・本番キー投入
- ・ 本番決済・LINE本番配信の疎通確認、データ最終確認
- ・ ロールバック手順の確認、本番デプロイ

完了条件：本番で主要フロー・実決済（審査承認済みの場合）が疎通する

19. 納品・引き渡し・運用開始

担当：PM / 目安 2人日 / W8

- ・ ソース・環境・設定・ドキュメントの引き渡し
- ・ 管理画面の操作レクチャー、運用開始・初期サポート開始

完了条件：お客様が運用を開始できる状態になっている

5. 工数サマリー

全工程の工数目安は合計 約116人日（ViFightの概算・契約時に精査）。8週間（実働約40日）で、複数役割が並行して進めます。1日あたりの平均稼働はおよそ3名相当で、開発の山場（W3～W6）に人員を厚く配分します。

- ・ 最も重い工程：Stripe本決済（14人日）、会員機能の本番化（12人日）、管理画面の本番化・自動テスト整備（各10人日）。
- ・ お金・書類・通知など「事故が許されない領域」に工数を厚く配分し、テスト・バッファも明示的に確保しています。

※ 具体的な人数配分・期間割当・費用は、体制と単価の確定後にお見積りでご提示します（要確定）。

6. マイルストーン

	時期の目安	内容・判定
M1	W1末	要件・設計・デザイン・品質基準（DoD）の確定。外部審査・法務の着手。
M2	W3末	インフラ構築完了（ステージング稼働）。LINEログイン動作。
M3	W6末（約1.5ヶ月）	フィーチャーコンプリート＝限定公開β。全機能が動作（実決済は審査承認後）。
M4	W7末	検収・QA・セキュリティ確認完了。指摘反映済み。
M5	W8末（約2ヶ月）	一般公開・正式納品。※本番実課金は各社審査の承認を前提。

7. 納品物

- ・ 本番稼働する会員向けWebアプリ（PWA）一式（ソースコード）と運営管理画面一式
- ・ GCP本番環境・ステージング環境（構成・監視・バックアップ込み）
- ・ 各種連携設定（LINEログイン・LINE／メール通知・Stripe決済・自動処理）
- ・ 自動テスト・CIの一式
- ・ ドキュメント（ご利用ガイド・管理画面マニュアル・運用手順書・環境構成図）

8. お客様にご準備・ご対応いただくこと

以下は納期を守るために特に重要です。外部審査には各社のリードタイム（LINE公式アカウント認証は目安10営業日程度、Stripe本番審査は数日～、追加書類を求められる場合あり）があるため、契約後すぐの着手をお願いします。

ご対応いただくこと	内容	期日の目安
要件・デザイン確認	キックオフでの仕様・デザイン・品質基準の最終確認。	W1
外部アカウント申請	LINE公式アカウント・LINE Developers、Stripeの開設と本番審査申請（手順はViFightが支援）。	W1中に着手
法務の窓口・意思決定	ViFightが紹介する専門家との調整・確認、規約等の内容承認。	W1-W4
コンテンツ提供	FAQ・提携店リスト・掲載文言等。	W2-W4
特典・表記の確認	提携店ギフト券・紹介特典の条件確定、AI相性表示の文言確認。	W5-W6
検収	検収と指摘のとりまとめ（各回3営業日以内が目安）。	W7

※ お客様側のご確認・ご準備・外部審査が期日を超えた場合、その超過日数分だけ納期を後ろにスライドします。

9. 対応範囲（スコープ）

今回の納品に含む（v1.0）	含まない（次フェーズでご提案）
LINEログイン（LIFF）／LINE・メール通知	AIの本格学習（成婚データ駆動の推薦）
Stripe本決済（登録・都度課金・違約金・更新・Webhook）	画像分析によるタイプ診断
書類アップロードの本運用・確認フロー	ネイティブアプリ化（ストア配信）
自動処理（自動解除・更新課金・アンケート）	不動産連携の成婚キャッシュバック本運用
会員向けアプリ・管理画面の本番化／自動テスト・CI	第三者ペネトレーションテスト・大規模負荷試験
相性推薦 v1（ルールベース）	多都市展開

10. お支払いについて（要確定）

お支払いの金額・比率・回数は要確定です。受託開発では、進行の節目に分けてお支払いいただくのが一般的で、一例として下記の構成があります（あくまで例で、確定値ではありません）。

区分（例）	タイミング（例）
着手金	契約締結時
中間金	M3：限定公開β（W6末・DoD達成を確認）
納品時	M5：一般公開・納品（W8末）

※ 総額・内訳・比率・支払時期は、体制と人日単価の確定後にお見積りで提示します。

11. リリース後の運用・保守・費用

- ・ 初期サポート（hypercare）：納品後の一定期間、初期不具合対応・監視強化を行います（期間は要確定）。
- ・ 瑕疵対応：納品物の不具合は、定めた保証期間内は無償で修正します（期間は要確定）。
- ・ 月額の実費：GCP等のサーバー費用・LINE通知の配信量に応じた費用・ドメイン等はおお客様のご負担（実費）です。概算は構成・想定利用規模の確定後に提示します（要確定）。
- ・ 継続保守（任意）：依存更新・キャッシュ整理・バグ修正・小改修を月額の保守契約としてご提案可能です（条件は要確定）。

12. 前提条件・リスクと対策

前提条件

- ・ ViFightの専任チームが本件に継続稼働できること。
- ・ LINE・Stripeのアカウント申請、および規約等の法務対応が、上表の期日までに進むこと。
- ・ 検収・ご確認は各回3営業日以内を目安にご対応いただけること。
- ・ 本番の実決済・LINE本番配信は、各社の本番審査の承認を前提とします（承認前はテストモードで先行）。

主なリスクと対策

リスク	対策
Stripe本番審査の遅延・追加要求（マッチングは慎重審査の対象）	契約直後に申請開始。承認前はテストモードで開発を進め、承認後に本番接続。βはテスト課金で先行可能。

リスク	対策
LINE公式アカウント／ログイン申請のリードタイム	W1中に申請。審査待ちの間もUI・連携実装を並行し、承認後に本番キーへ差し替え。
法務対応（異性紹介事業の届出等）がリリースを止める	W1で該当判断に着手。届出が必要な場合は手続きと並行して開発し、公開はクリア後に。
検収の手戻り・仕様追加	予備日（工程17）で吸収。大きな追加はPhase 2以降へ振り分け（変更管理）。
お客様側のご準備の遅延	各準備物に期日を設定し、超過分は納期をスライド。週次定例で進捗を可視化。

13. 要確定事項（TBD）一覧

本工程表では、以下の項目を推測で埋めていません。確定でき次第、本書に反映します。

項目	内容	状態
着手日（実日付）	契約締結日=W1開始の実カレンダー日付。	要確定
体制の人数	役割は記載済み。各役割の人数（兼任含む）。	要確定
お支払い	総額・内訳・比率・支払時期（現状は例のみ）。	要確定
人日単価	工数→金額換算のための単価（金額記載を行う場合）。	要確定
保証期間・初期サポート	瑕疵対応の保証期間、hypercareの期間。	要確定
月額保守	継続保守の有無・範囲・月額条件。	要確定
月額実費（GCP等）	概算の前提となる想定同時利用者数・配信量。	要確定
データ移行	プロトタイプに実ユーザー・実データがあるか（移行工程の要否）。	要確認
会社情報	ViFightの正式社名・連絡先（表紙・フッター用）。	要確定
法務専門家	ViFightが紹介・調整する前提で確定か。	要確認
工程12の工数	AIアドバイザー削除（2026年9月決定）に伴う相性推薦 v1 の人日の見直し。	要確定

14. 補足：1.5ヶ月での短縮納品について

W6末（約1.5ヶ月）のβ（限定公開）時点で先行リリースする短縮案も可能です。その場合、実決済は審査承認後の開始、一部の作り込み（相性推薦 v1の精度向上・管理画面の一部運用機能・テスト範囲の拡充など）はリリース後の継続改善に回します。品質と安全性を優先する場合は、予備日を含む2ヶ月での一般公開・正式納品を推奨します。
