



サツコイ！（仮） 制作工程表

本番リリース（v1.0）までの開発スケジュール

納品目安：着手から1.5～2ヶ月


2026年7月 発行：ViFight

1. 本工程表について

本書は、すでに完成・公開しているプロトタイプ（Phase 1）をもとに、外部連携を実運用化し「本番リリース（v1.0）」として納品するまでの制作スケジュールです。全体を8週間（約2ヶ月）で構成し、1.5ヶ月時点で機能を完成（β）、そこから検収・調整を経て2ヶ月時点で正式納品します。

- ・ 起点：契約締結（着手）を第1週の開始とします。実日付はキックオフ時に確定します。
- ・ 体制：開発・インフラ・デザインは ViFight が担当。お客様には要所までのご確認と、外部アカウント・コンテンツのご準備をお願いします（第6章）。
- ・ 進め方：実際に動く画面を見ていただきながら開発を進め、各マイルストーンで確認・検収をいただきます。

2. 全体スケジュール

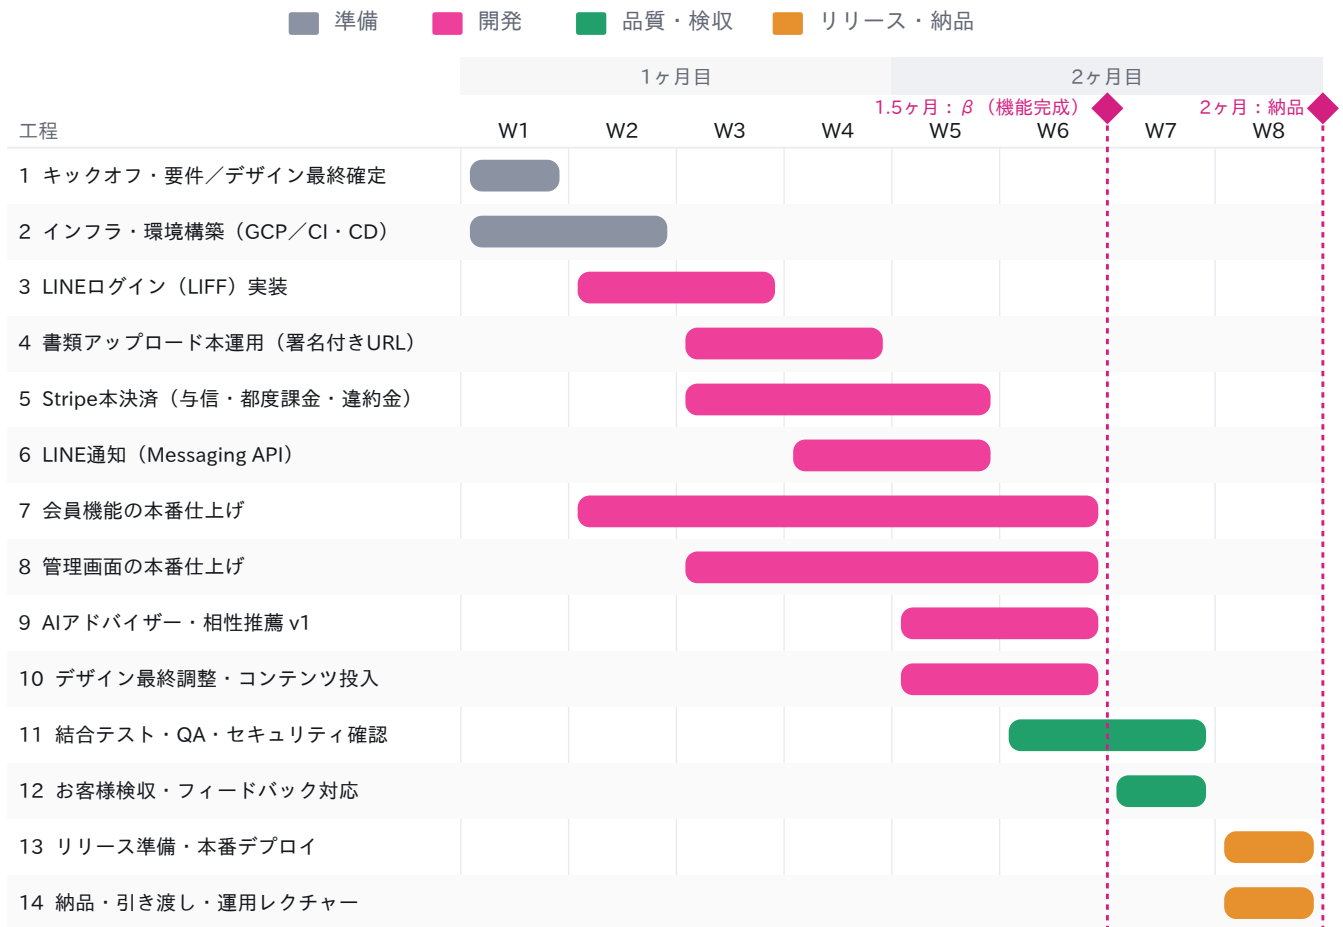

W=着手からの週数。破線は主要マイルストーン（1.5ヶ月＝機能完成β／2ヶ月＝正式納品）を示します。

3. 工程の内容

工程	主な作業内容	時期
1 要件・設計確定	スコープ・画面・仕様・デザインの最終確定、開発計画の合意。	W1
2 インフラ構築	GCP（Cloud Run／Cloud SQL／Cloud Storage）構築、CI・CD、ステージング環境、ドメイン・SSL。	W1-W2
3 LINEログイン	LINE Login（LIFF）による会員連携、既存メール認証との統合。	W2-W3
4 書類本運用	証明書類の署名付きURL管理・非公開保管、提出→運営確認→承認の運用フロー。	W3-W4
5 Stripe本決済	登録時の与信（ブラックリスト確認兼）、日程確定時5,500円の都度課金、違約金・返金・更新料自動決済。	W3-W5
6 LINE通知	Messaging APIで申込・マッチ成立・日程確定・リマインドを配信（メール・アプリ内と選択制）。	W4-W5
7 会員機能仕上げ	全画面の本番対応、入力バリデーション、異常系・境界値の作り込み。	W2-W6
8 管理画面仕上げ	実運用機能、権限管理、操作の監査ログ、要対応の可視化。	W3-W6
9 AI v1	AIアドバイザー・相性推薦の実用ロジック実装（本格的な学習モデルはPhase 3）。	W5-W6
10 仕上げ・投入	デザイン最終調整、利用規約・FAQ・提携店データ等のコンテンツ投入。	W5-W6
11 テスト・QA	結合テスト、決済テスト（テストモード）、セキュリティ確認、負荷の基本確認。	W6-W7
12 検収・修正	お客様による検収、指摘事項の反映。	W7
13 リリース準備	本番環境への切替、決済・通知の本番疎通、最終確認。	W8
14 納品・引き渡し	納品物一式の受け渡し、管理画面の操作レクチャー、運用開始。	W8

4. マイルストーン

	時期の目安	内容・判定
M1	W1末	要件・設計・デザインの確定。開発計画の合意。
M2	W2末	インフラ・環境構築完了。ステージング環境が稼働。
M3	W5末（約1.25ヶ月）	主要機能の実装完了（LINEログイン・決済・書類・通知）。
M4	W6末（約1.5ヶ月）	フィーチャーコンプリート（β）。全機能が動作。短縮納品の判断点。
M5	W7末	検収・QA完了。指摘事項の反映済み。
M6	W8末（約2ヶ月）	本番リリース・正式納品。

5. 納品物

- ・ 本番稼働する会員向けWebアプリ（PWA）一式（ソースコード）
- ・ 運営管理画面一式
- ・ GCP本番環境・ステージング環境（構成込み）
- ・ 各種連携設定（LINEログイン・LINE通知・Stripe決済）
- ・ ドキュメント（ご利用ガイド・管理画面マニュアル・運用手順・環境構成図）

6. お客様にご準備・ご対応いただくこと

以下は納期を守るために特に重要です。各期日までにご対応いただけると、遅延なく進行できます。

ご対応いただくこと	内容	期日の目安
要件・デザイン確認	キックオフMTGでの仕様・デザインの最終確認。	W1
LINEの準備	LINE公式アカウントの開設と LINE Developers の設定（手順はViFightがサポート）。※Webアプリでもログイン・通知は実装可能です。	W2までに
Stripeの準備	Stripeアカウントの開設・本番審査の申請（早期着手を推奨）。	W2までに
コンテンツ提供	利用規約・プライバシーポリシー・特商法表記・FAQ・提携店リスト。	W2までに
AI・特典の監修	AIアドバイザーの文言監修、提携店ギフト券・紹介特典の条件確定。	W5-W6
検収	検収用チェックと、指摘のとりまとめ（各回3営業日以内を目安）。	W7

補足（LINE連携について）：LINEログイン（LINE Login／LIFF）とLINE通知（Messaging API）は、いずれもWebアプリで実現できるLINEの標準機能です。実装にはお客様名義のLINE公式アカウントが必要で、通知の大量配信時は月額プラン（従量）が発生する場合があります。

7. 対応範囲（スコープ）

今回の納品に含む（v1.0）	含まない（次フェーズでご提案）
LINEログイン（LIFF）／LINE通知（Messaging API）	AIの本格学習（RAG・成婚データ駆動の推薦）
Stripe本決済（与信・都度課金・違約金・更新）	画像分析によるタイプ診断
書類アップロードの本運用・確認フロー	ネイティブアプリ化（ストア配信）
会員向けアプリ・管理画面の本番化	不動産連携の成婚キャッシュバック本運用
AIアドバイザー・相性推薦 v1（実用ロジック）	多都市展開

8. お支払いマイルストーン（例）

区分	タイミング	割合
着手金	契約締結時	40%
中間金	M3：主要機能実装完了（W5末）	30%
納品時	M6：本番リリース・納品（W8末）	30%

※ 金額・比率は別途お見積り・ご契約にて確定します。

9. 前提条件・リスクと対策

前提条件

- ・ LINE公式アカウント・Stripeアカウントが所定の期日までにご用意されること。
- ・ コンテンツ（規約・FAQ・提携店等）が期日までにご提供されること。
- ・ 検収・ご確認は各回3営業日以内を目安にご対応いただけること。
- ・ 決済・LINE配信の本番稼働は、各社の本番審査の承認を前提とします。

主なリスクと対策

リスク	対策
Stripe本番審査・LINEアカウント審査の遅延	契約直後に申請を開始。承認前はテストモードで並行開発し、承認後に本番接続へ切替。
提携カフェ・美容室の確保の遅れ	デート店舗の割り当ては暫定運用でも先行リリース可能な設計とし、提携拡大は運用中に継続。
開発途中の仕様追加・変更	変更管理表で影響を評価。軽微は本フェーズ、大きな追加はPhase 2以降へ振り分け。
お客様側のご確認・ご準備の遅延	各準備物に期日を設定し、週次定例で進捗を可視化。クリティカルパスを優先。

10. 補足：1.5ヶ月での短縮納品について

W6末（約1.5ヶ月）のβ（機能完成）時点で、検収を簡略化し先行リリースする短縮案も可能です。その場合、テスト・調整・一部の作り込み（AI v1の精度向上や管理画面の一部運用機能など）はリリース後の継続改善に回します。品質を優先する場合は2ヶ月での正式納品を推奨します。
